

PF-01_cronograma


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	Issue	Fase	Horas
0			**PF-01_cronograma**	**36 días**	**10/10/26 09:00**	**26/11/26 18:0**				**0**
1			**1 Gestión**	**16 días**	**10/10/26 09:00**	**29/10/26 18:00**				**0**
2	✓		1.1 Acta y alcance	2 días	10/10/26 09:00	11/10/26 18:00		#2	1 Planificación	1
3	✓		**1.2 Plan y línea base en Project**	**1 día**	**11/10/26 09:00**	**11/10/26 18:00**		**#3**	**1 Planificación**	**1.5**
4	✓		EDT, Gantt y plan GitHub	1 día	11/10/26 09:00	11/10/26 18:00	2	#3	1 Planificación	0
5	✓		Plan aprobado	0 días	11/10/26 18:00	11/10/26 18:00	4	#3	1 Planificación	0
6	✓		Línea base, repositorio y plan GitHub	1 día	11/10/26 09:00	11/10/26 18:00	5	#3	1 Planificación	0
7			1.3 Cierre y desvíos	1 día	29/10/26 09:00	29/10/26 18:00	22	#13	3 Cierre	1
8			Listo para cierre	0 días	29/10/26 18:00	29/10/26 18:00	7	#13	3 Cierre	0
9	✓		**2 Datos**	**4 días**	**11/10/26 09:00**	**14/10/26 23:23**				**0**
10	✓		2.1 Extracción	1 día	11/10/26 09:00	11/10/26 18:00	6	#4	2 Ejecución	4.5
11	✓		2.2 Validación	1 día	11/10/26 09:00	11/10/26 18:00	10	#5	2 Ejecución	2.5
12	✓		2.3 Modelo de datos Oracle	2 días	11/10/26 19:05	14/10/26 04:10	11	#6	2 Ejecución	3.5
13	✓		2.4 Arquitectura y modelo de datos en Visio	0.63 días	14/10/26 11:57	14/10/26 23:23	12	#24	2 Ejecución	0
14	✓		**3 Análisis**	**5 días**	**15/10/26 00:20**	**21/10/26 23:27**				**0**
15	✓		3.1 Exploración	47 mins	15/10/26 00:20	15/10/26 01:07	12	#7	2 Ejecución	1
16	✓		3.2 Indicadores y matriz	197 mins	18/10/26 00:38	18/10/26 03:55	15	#8	2 Ejecución	2
17	✓		3.3 Validación de resultados	60 mins	18/10/26 04:12	18/10/26 05:12	16	#9	2 Ejecución	1



PF-01_cronograma


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	Issue	Fase	Horas
18	✓		3.4 Proceso AS-IS y TO-BE en Bizag	3 días	18/10/26 15:58	21/10/26 23:27	17	#25	2 Ejecución	0
19			**4 Producto**	**5 días**	**22/10/26 09:00**	**28/10/26 18:00**				**0**
20	✓		4.1 Tablero Power BI	3 días	22/10/26 09:00	26/10/26 20:04	17	#10	2 Ejecución	4
21			4.2 Informe	1 día	27/10/26 09:00	27/10/26 18:00	20	#11	2 Ejecución	1.5
22			4.3 README	1 día	28/10/26 09:00	28/10/26 18:00	21;13;18	#12	2 Ejecución	1
23			**5 Comunicación**	**20 días**	**30/10/26 09:00**	**26/11/26 18:00**				**0**
24			5.1 Post	2 días	30/10/26 09:00	02/11/26 18:00	8	#14	3 Cierre	0.5
25			5.2 Documento PDF	2 días	30/10/26 09:00	02/11/26 18:00	8	#15	3 Cierre	1.5
26			Publicación en LinkedIn	0 días	26/11/26 09:00	26/11/26 09:00	24;25	#16	3 Cierre	0
27			5.3 Destacados y registro	1 día	26/11/26 09:00	26/11/26 18:00	26	#16	3 Cierre	0.5



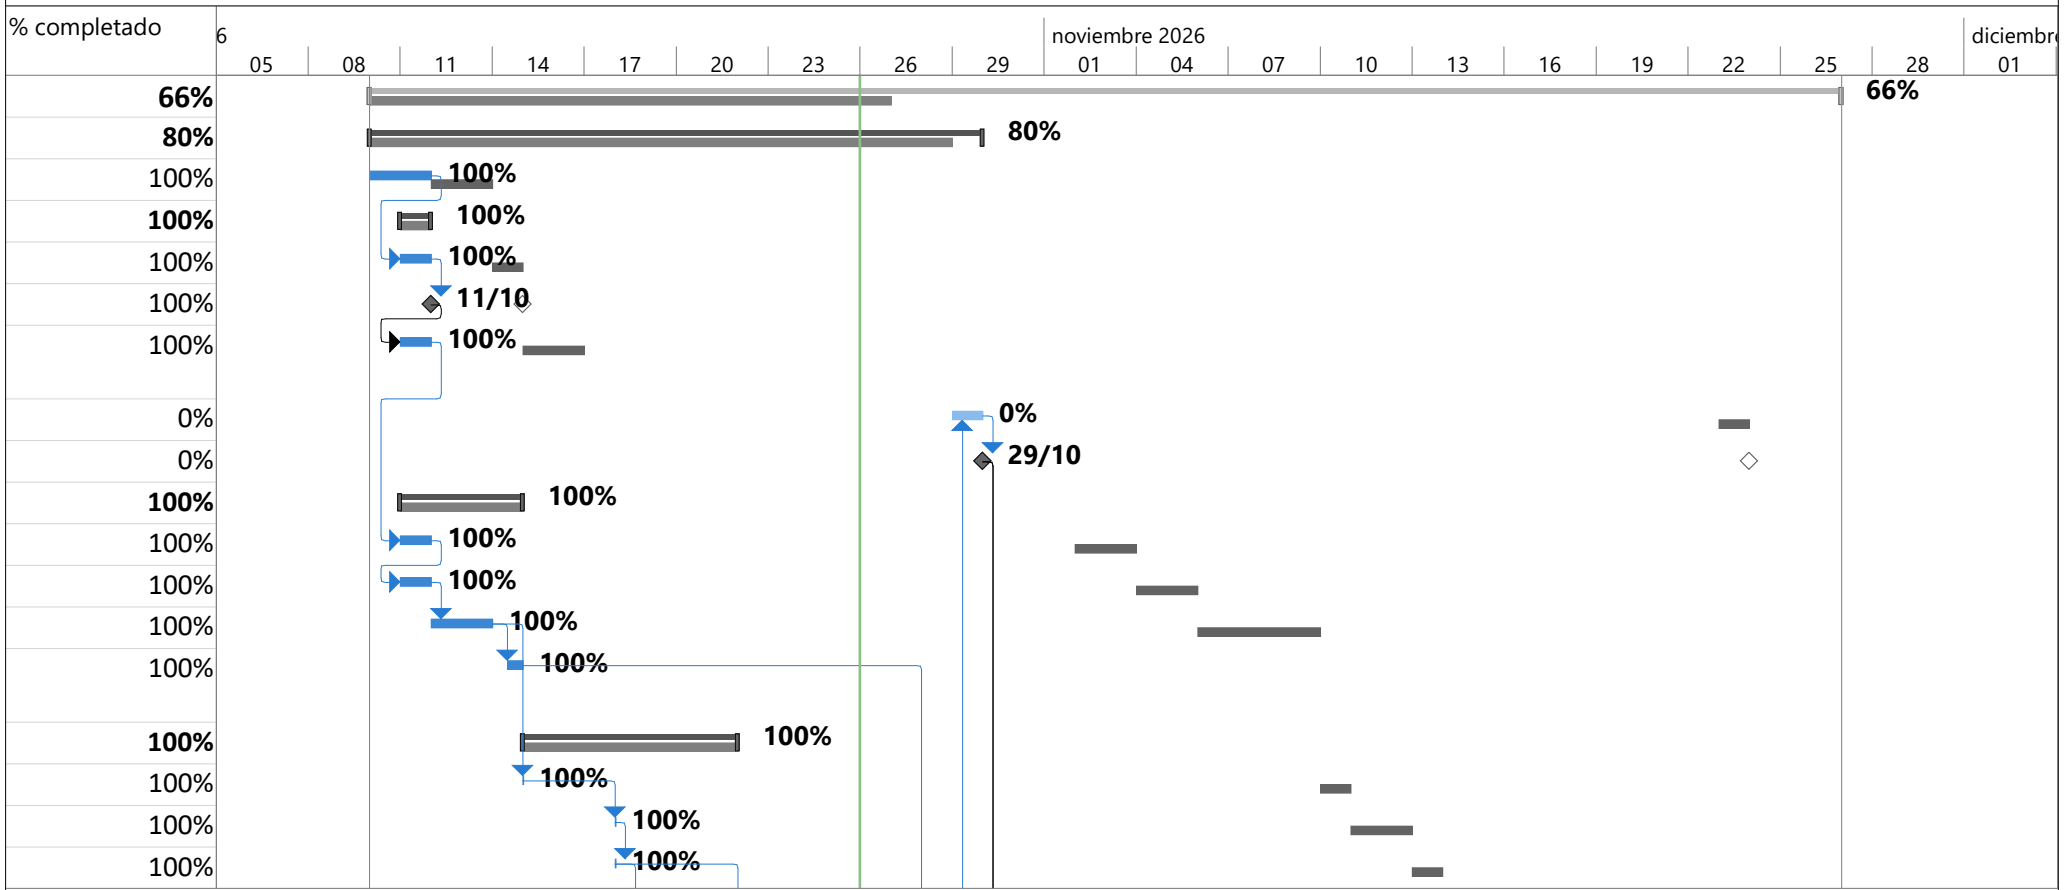

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PF-01_cronograma

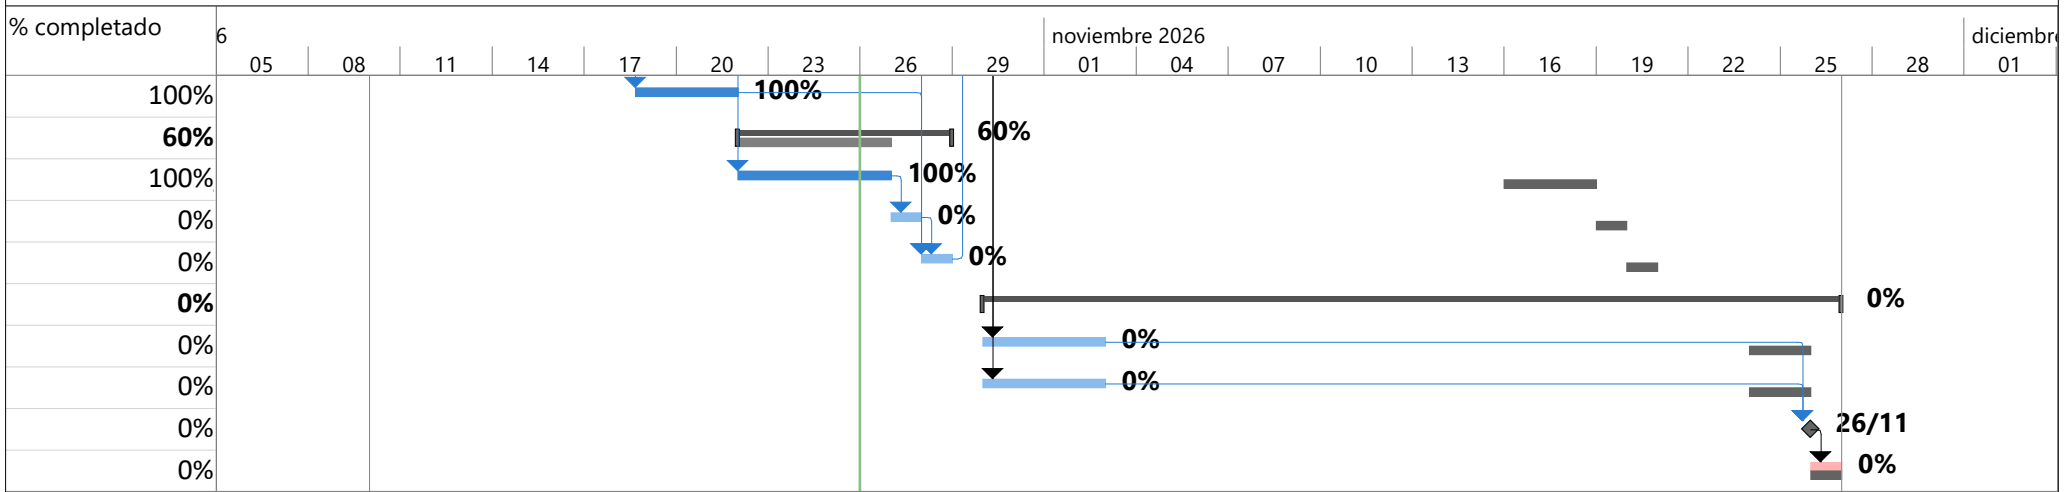

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
