

PF-01_cronograma

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	Issue	Fase	Horas
1		**1 Gestión**	**33 días**	**10/10/26 09:00**	**23/11/26 18:00**				**0**
2		1.1 Acta y alcance	2 días	10/10/26 09:00	11/10/26 18:00		#2	1 Planificación	1
3		**1.2 Plan y línea base en Project**	**3 días**	**11/10/26 09:00**	**13/10/26 18:00**		**#3**	**1 Planificación**	**1.5**
4		EDT, Gantt y plan GitHub	1 día	11/10/26 09:00	11/10/26 18:00	2	#3	1 Planificación	0
5		Plan aprobado	0 días	11/10/26 18:00	11/10/26 18:00	4	#3	1 Planificación	0
6		Línea base, repositorio y plan GitH	2 días	12/10/26 09:00	13/10/26 18:00	5	#3	1 Planificación	0
7		1.3 Cierre y desvíos	1 día	23/11/26 09:00	23/11/26 18:00	20	#13	3 Cierre	1
8		Listo para cierre	0 días	23/11/26 18:00	23/11/26 18:00	7	#13	3 Cierre	0
9		**2 Datos**	**6 días**	**02/11/26 09:00**	**09/11/26 18:00**				**0**
10		2.1 Extracción	2 días	02/11/26 09:00	03/11/26 18:00	6	#4	2 Ejecución	4.5
11		2.2 Validación	2 días	04/11/26 09:00	05/11/26 18:00	10	#5	2 Ejecución	2.5
12		2.3 Modelo de datos Oracle	2 días	06/11/26 09:00	09/11/26 18:00	11	#6	2 Ejecución	3.5
13		**3 Análisis**	**4 días**	**10/11/26 09:00**	**13/11/26 18:00**				**0**
14		3.1 Exploración	1 día	10/11/26 09:00	10/11/26 18:00	12	#7	2 Ejecución	1
15		3.2 Indicadores y matriz	2 días	11/11/26 09:00	12/11/26 18:00	14	#8	2 Ejecución	2
16		3.3 Validación de resultados	1 día	13/11/26 09:00	13/11/26 18:00	15	#9	2 Ejecución	1
17		**4 Producto**	**5 días**	**16/11/26 09:00**	**20/11/26 18:00**				**0**
18		4.1 Tablero Power BI	3 días	16/11/26 09:00	18/11/26 18:00	16	#10	2 Ejecución	4
19		4.2 Informe	1 día	19/11/26 09:00	19/11/26 18:00	18	#11	2 Ejecución	1.5
20		4.3 README	1 día	20/11/26 09:00	20/11/26 18:00	19	#12	2 Ejecución	1

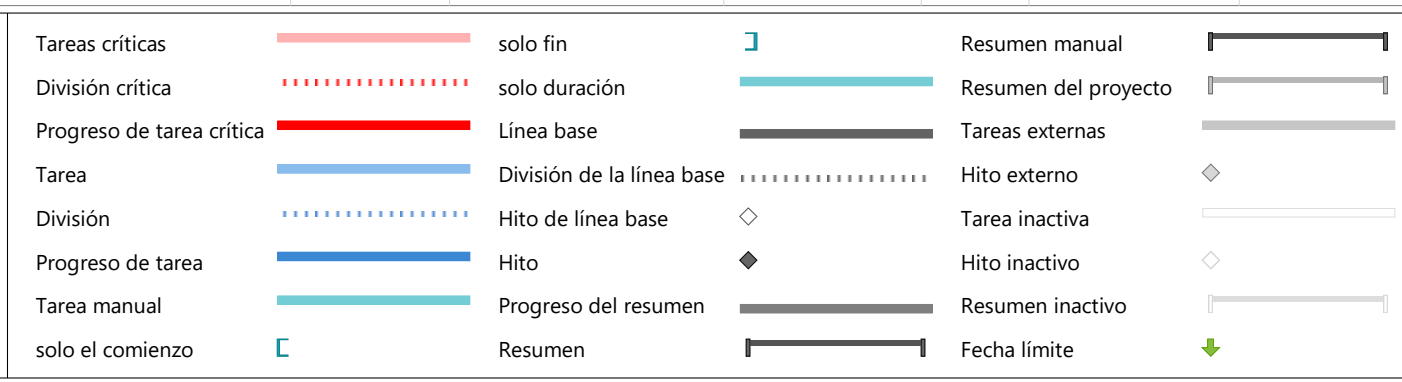


PF-01_cronograma

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Issue	Fase	Horas
21		**5 Comunicación**	**3 días**	**24/11/26 09:00**	**26/11/26 18:00**				**0**
22		5.1 Post	2 días	24/11/26 09:00	25/11/26 18:00	8	#14	3 Cierre	0.5
23		5.2 Documento PDF	2 días	24/11/26 09:00	25/11/26 18:00	8	#15	3 Cierre	1.5
24		Publicación en LinkedIn	0 días	26/11/26 09:00	26/11/26 09:00	22;23	#16	3 Cierre	0
25		5.3 Destacados y registro	1 día	26/11/26 09:00	26/11/26 18:00	24	#16	3 Cierre	0.5



PF-01_cronograma

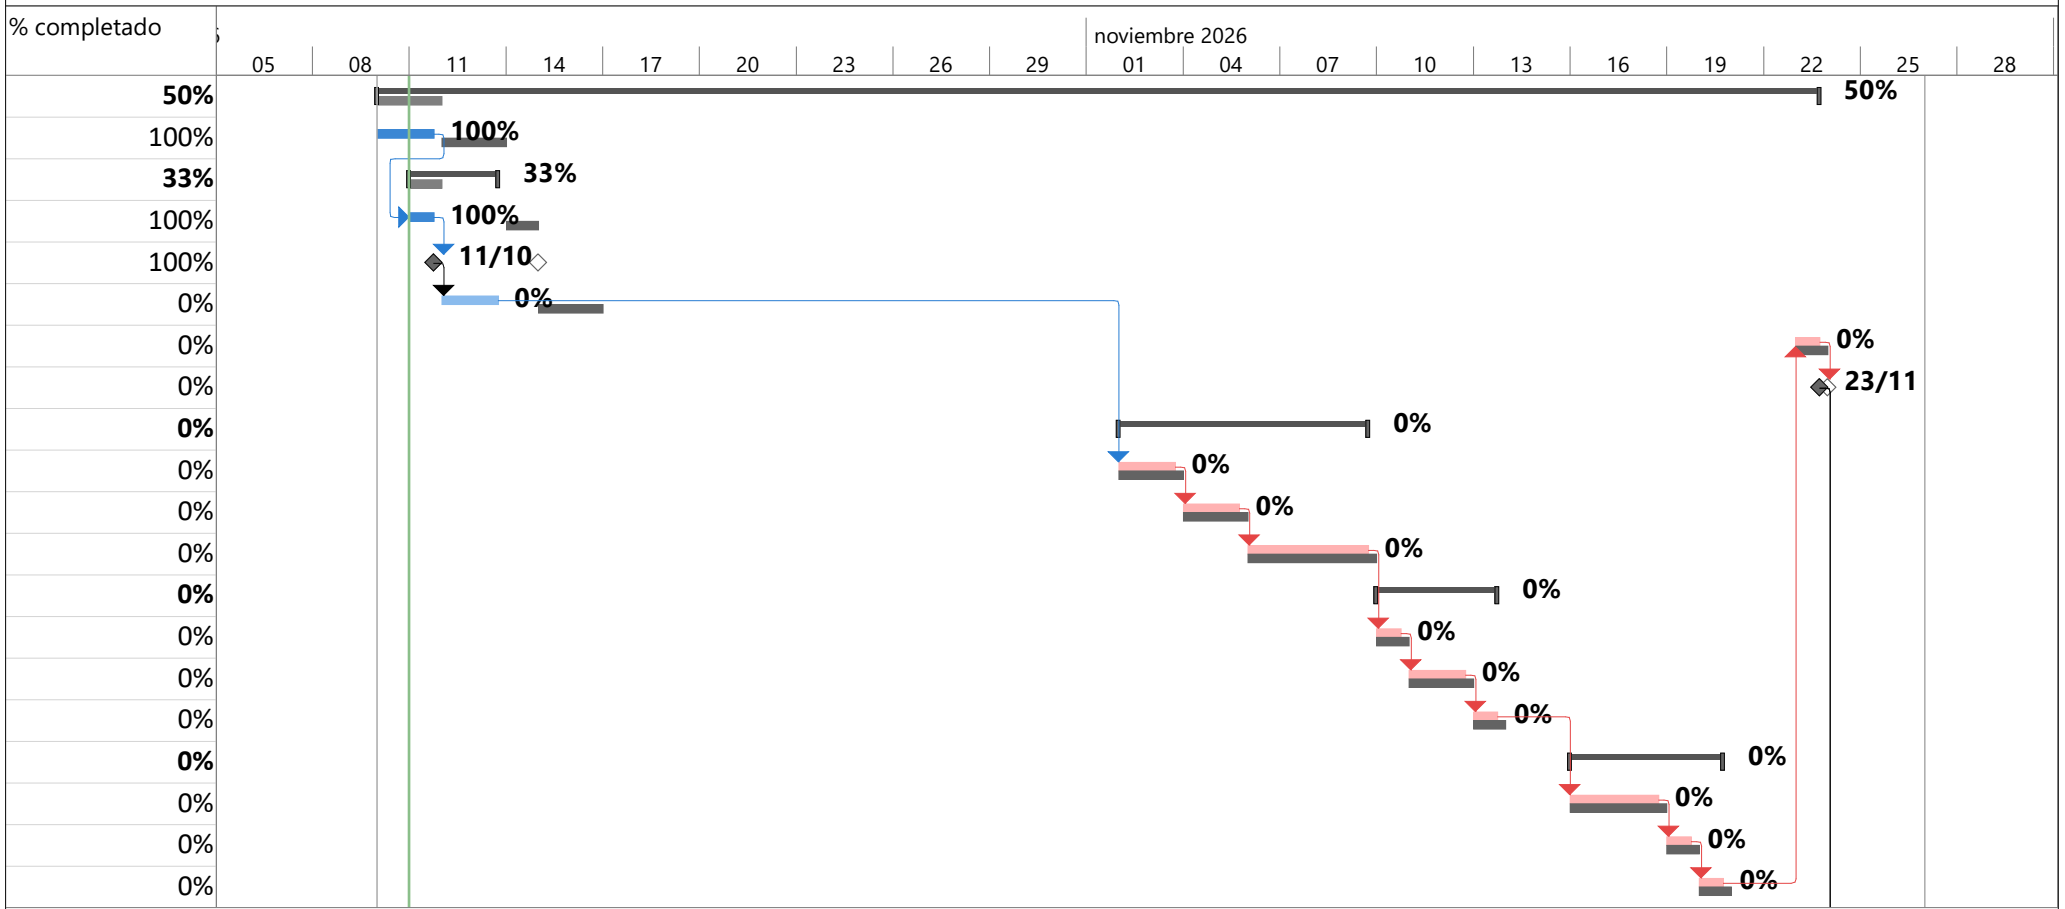

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PF-01_cronograma

